第22-B2763号

分 析 結 果 報 告 書

2022年9月27日

中城村長　浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE 200652-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原[illegible]
TEL：098－897－0910(代)

工　事　名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校　16-2号棟　中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月13日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター　仲座照幸・大濱常治・山内大輝・名嘉眞健志
分 析 対 象	建材試料：13検体　　受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分　析　者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日：　2022年8月17日　　分析終了日：　2022年9月26日

分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。

[特記事項]
・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2763号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8065	3階　機械室　壁　木毛セメント板	無検出	-	-	
8066	3階　機械室　床　モルタル金ゴテ	無検出	-	-	
8067	3階　機械室　冷却水管　パイプフランジパッキン	クリソタイル	5～50	非飛散性	
8068	3階　機械室　冷水管　パイプ保温材(エルボ)	無検出	-	-	
8069	3階　機械室　エアハン　本体保温材	無検出	-	-	
8070	3階　機械室　エアハン　ダクト保温材	無検出	-	-	
8071	3階　機械室　チャンバー　ダクトフランジパッキン	無検出	-	-	
8072	3階　機械室　チャンバー　たわみ継手	無検出	-	-	
8073	3階　外部　軒天　コンクリート打放しVPヌリ及び下地材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8074	3階　外部　外壁　複層塗材及び下地材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2022.9.26

株式会社沖縄環境分析センター之印

第22-B2763号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8075	3階　外部　建具廻り　シーリング材及び下地材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8076	R階　外部　屋根　ウレタン塗膜防水及び下地材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8077	R階　外部　膨張水槽　パイプフランジパッキン	無検出	–	–	

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2022.9.26

株式会社沖縄環境分析センター之印

顕微鏡写真（22-B2763）

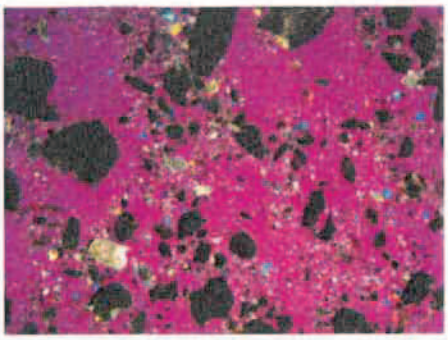

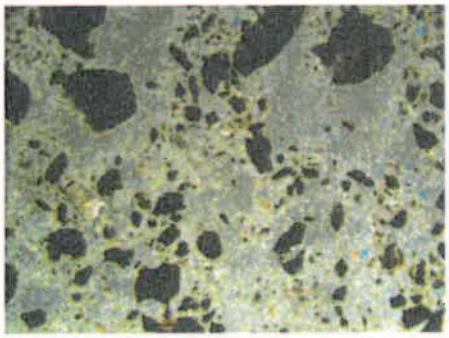

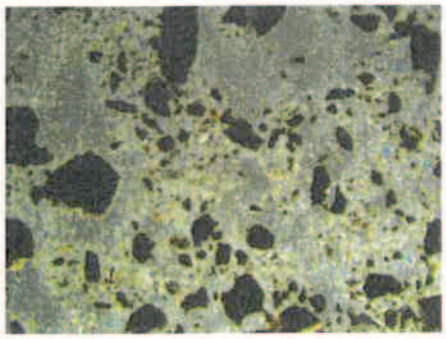

ID.No：8065
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

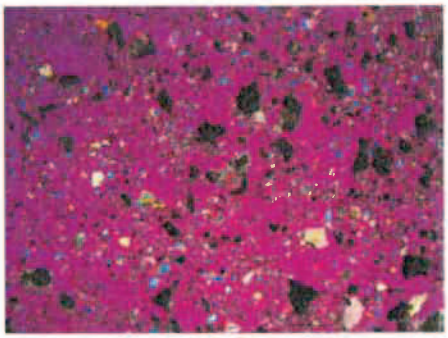

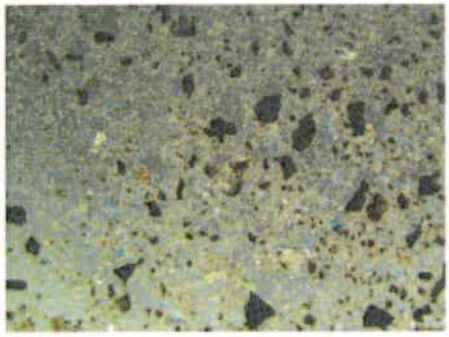

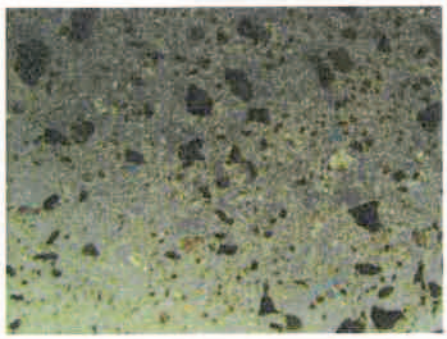

ID.No：8066
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

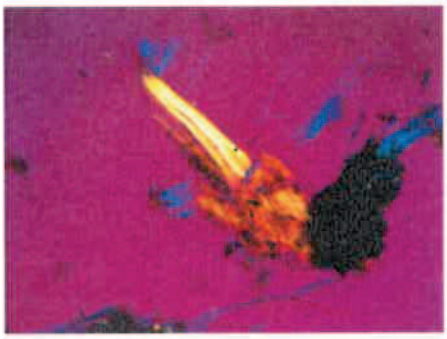

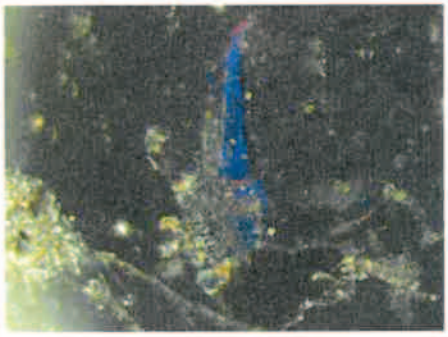

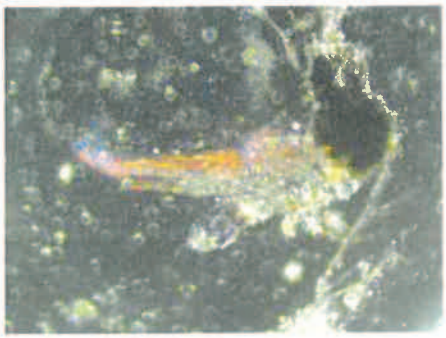

ID.No：8067
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

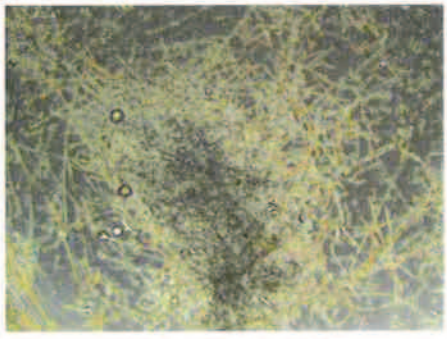

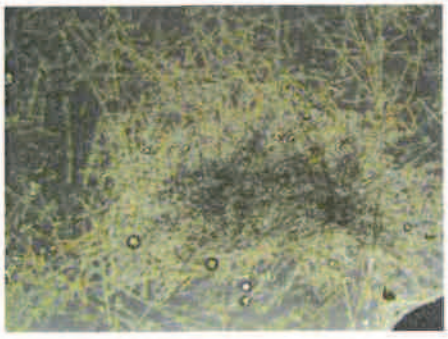

ID.No：8068
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2763）

ID.No：8069
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

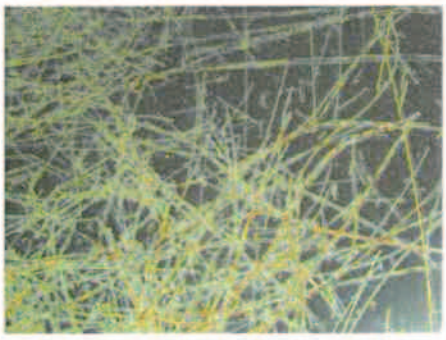

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

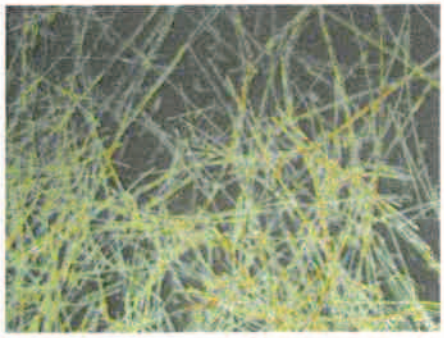

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

ID.No：8070
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

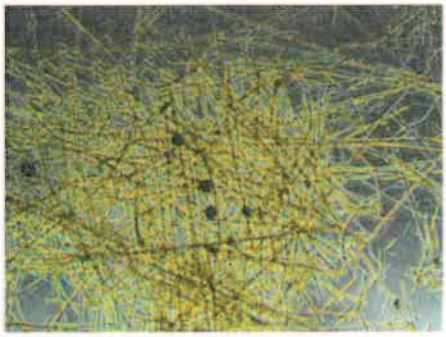

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

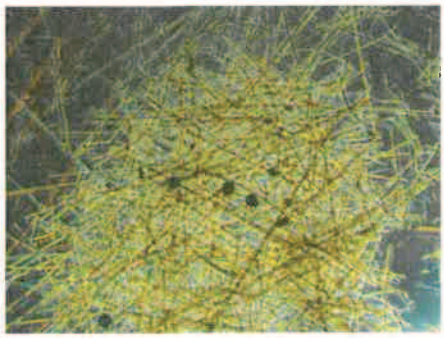

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

ID.No：8071
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

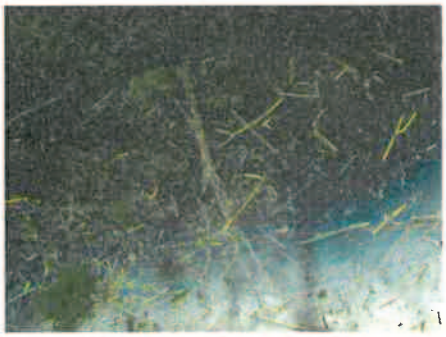

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

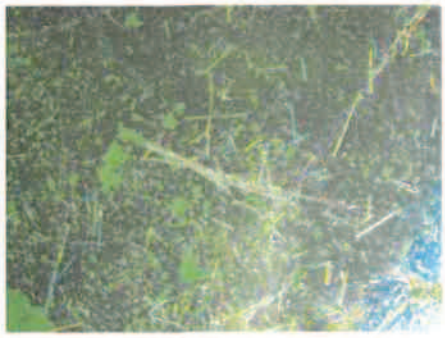

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

ID.No：8072
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

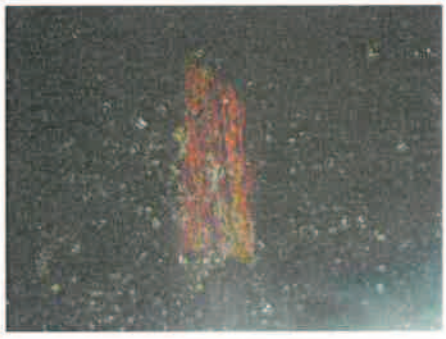

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2763）

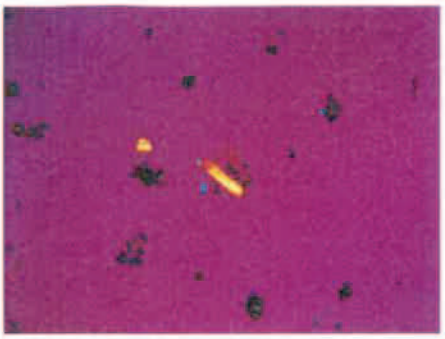

ID.No：8073
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

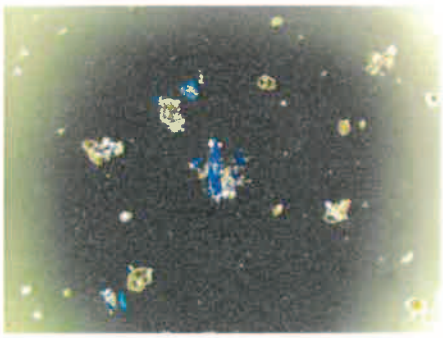

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

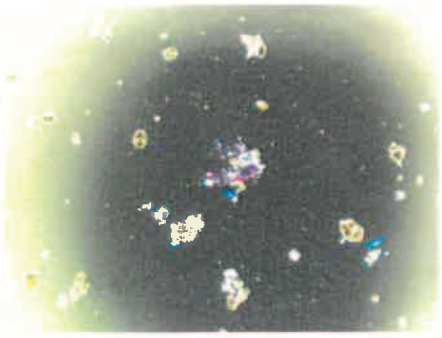

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

ID.No：8074
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

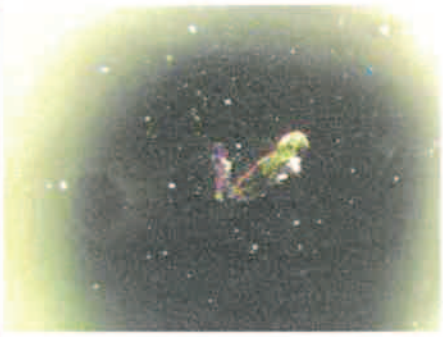

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

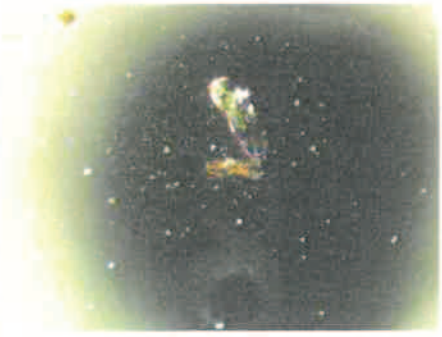

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

ID.No：8075
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

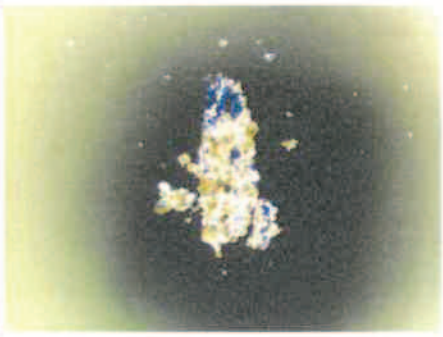

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

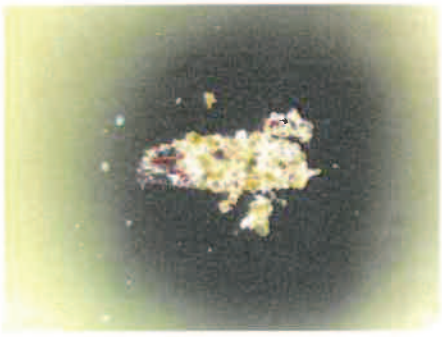

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

ID.No：8076
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2763）

ID.No：8077
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

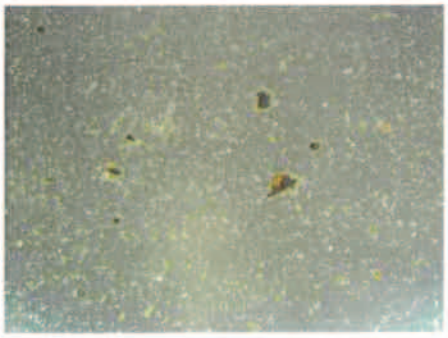

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

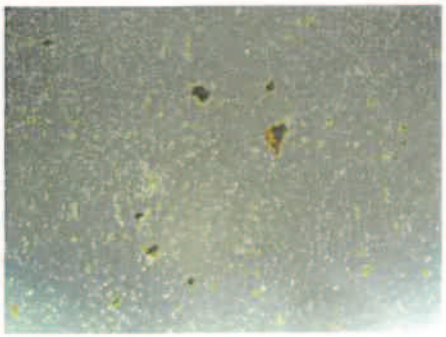

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

第22-B2764号

分 析 結 果 報 告 書

2022年9月28日

中城村長　浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号47-3
NVLAP LAB CODE：200552-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL：098-897-0910(代)

工　事　名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校　17-1号棟　中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月15日　～　2022年8月16日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター　仲座照幸・大濱常治・山内大輝・石原昌勝
分 析 対 象	建材試料：15検体　受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法ー第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分　析　者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月17日　分析終了日：2022年9月27日

分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。

[特記事項]
・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2764号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8078	1階　廊下　天井　穴あき石膏ボード	無検出	-	-	
8079	1階　廊下　天井　石膏ボード	無検出	-	-	
8080	1階　廊下　壁　モルタル金ゴテ	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8081	1階　廊下　巾木　ソフト巾木&接着剤	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
8082	1階　廊下　床　長尺シート&接着剤	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8083	1階　普通教室　天井　平石膏ボード下地ロックウール化粧吸音板	無検出	-	-	
8084	1階　普通教室　床　ビニール系床タイル&接着剤	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
8085	1階　普通教室　床　長尺シート&接着剤	無検出	-	-	
8086	2階　廊下　床(便所前)　長尺シート&接着剤	無検出	-	-	
8087	2階　便所　天井　フレキシブルボード	無検出	-	-	

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2022.9.26

分沖株
ー析縄式
之セ環会
印ン境社

第22-B2764号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8088	2階　便所　壁　セラミックタイル	無検出	-	-	
8089	2階　便所　床　モザイクタイル	無検出	-	-	
8090	1階　外部　軒天　複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
8091	1階　外部　外壁　モルタル刷毛引VPヌリ	無検出	-	-	
8092	1階　外部　建具廻り　シーリング材	無検出	-	-	

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

沖縄環境分析株式会社之印

顕微鏡写真（22-B2764）

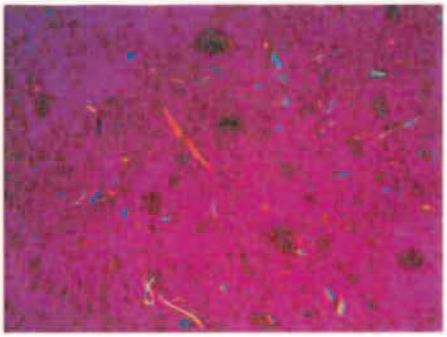

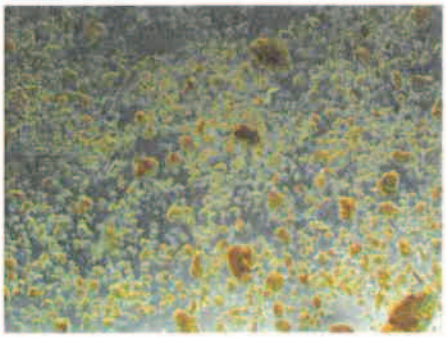

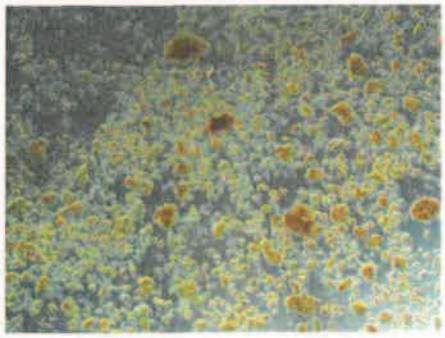

ID.No：8078
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

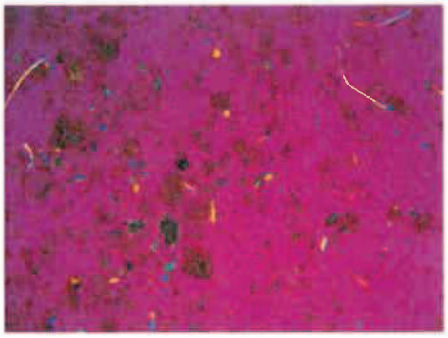

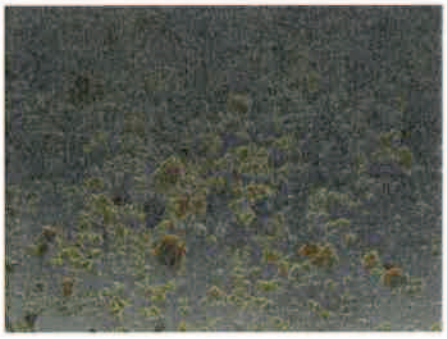

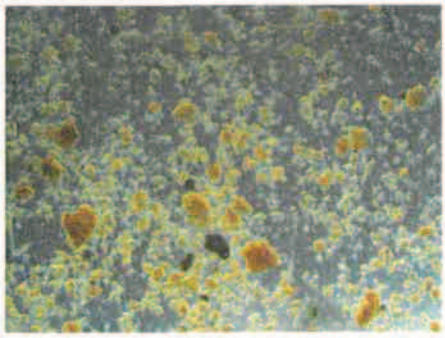

ID.No：8079
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

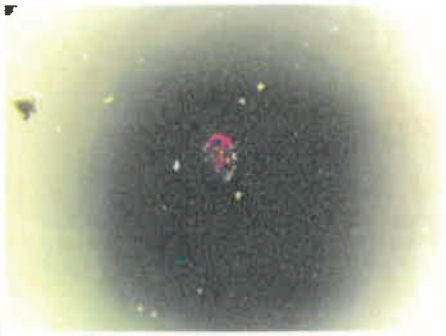

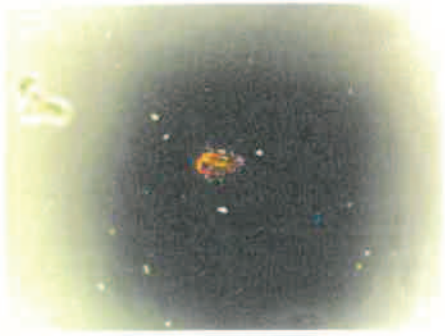

ID.No：8080
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

ID.No：8081
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2764）

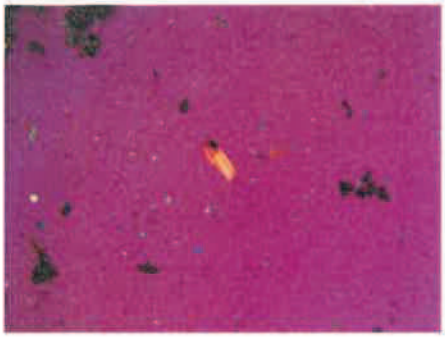
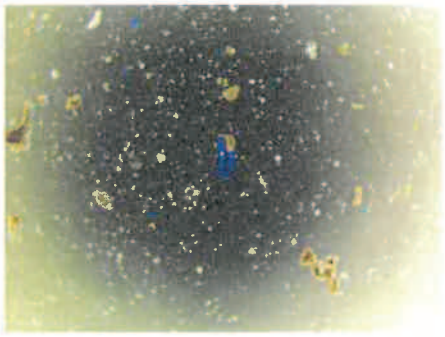
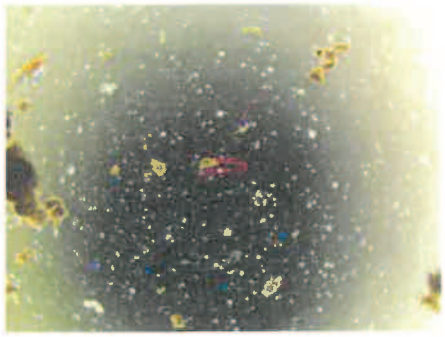

ID.No：8082
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

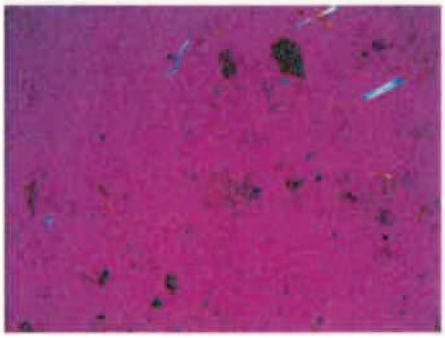
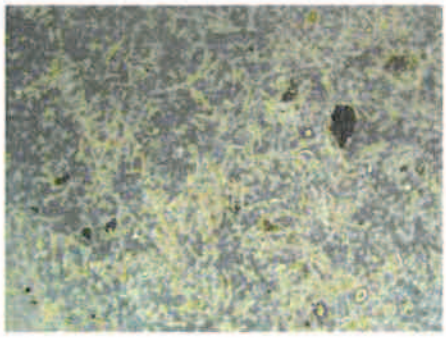
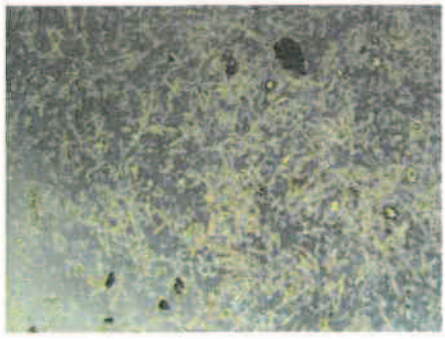

ID.No：8083
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

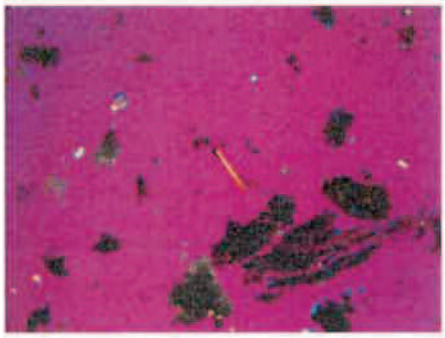
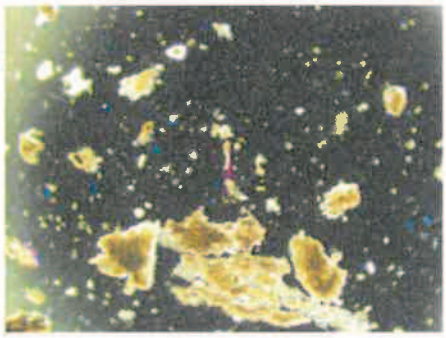
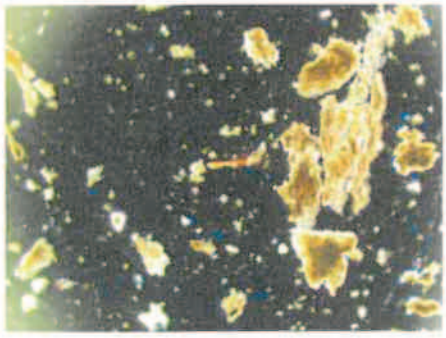

ID.No：8084
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

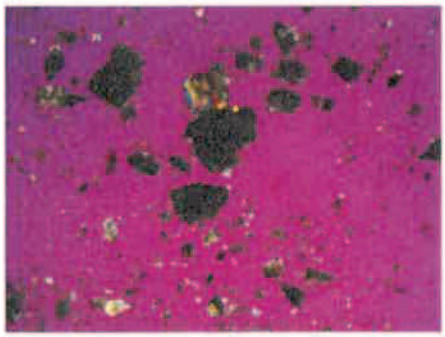
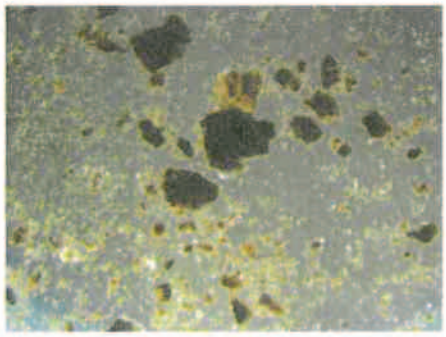
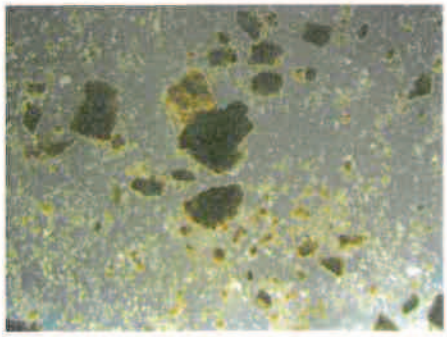

ID.No：8085
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真 (22-B2764)

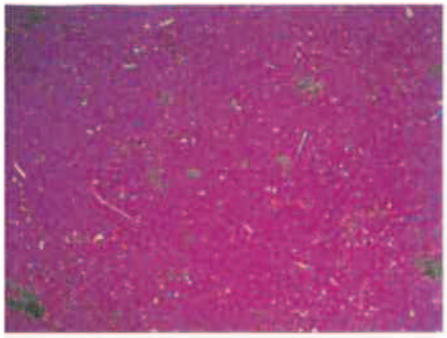

ID.No : 8086
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

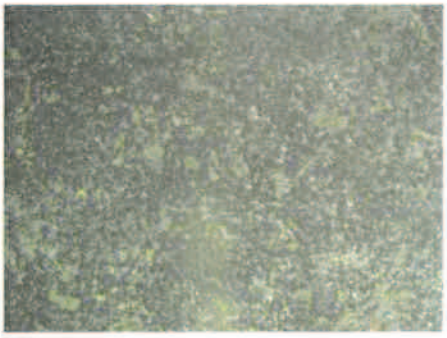

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

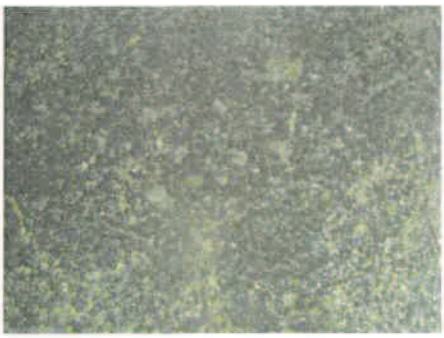

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

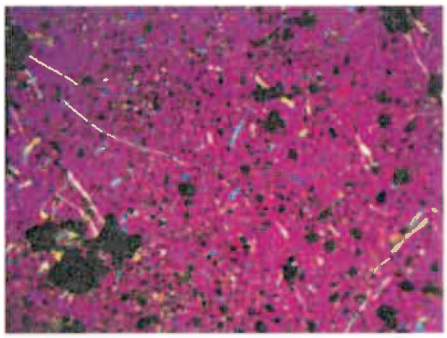

ID.No : 8087
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

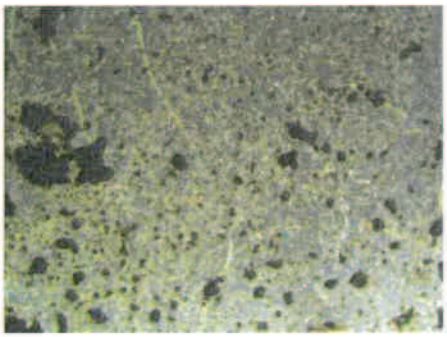

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

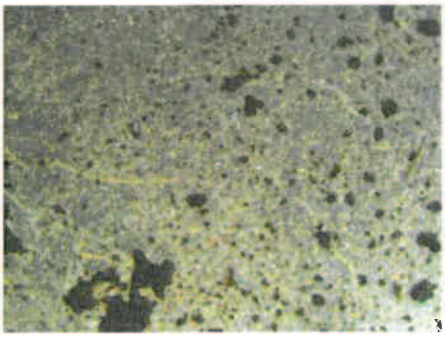

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

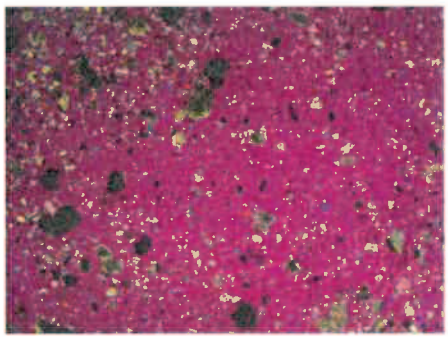

ID.No : 8088
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

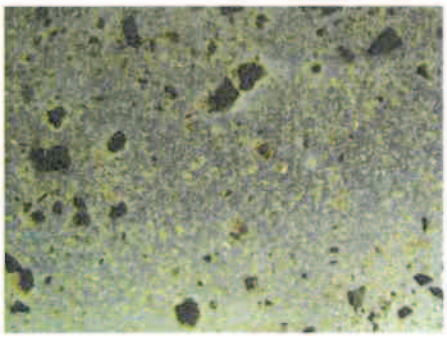

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

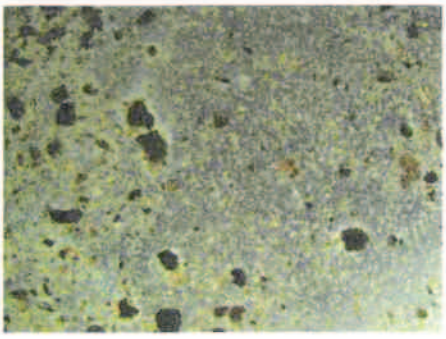

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

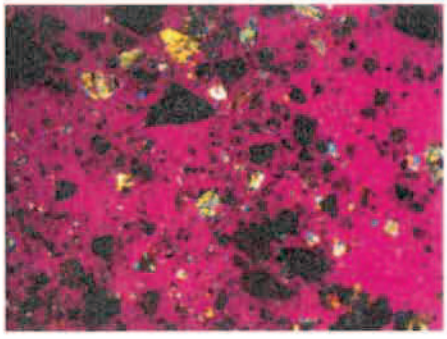

ID.No : 8089
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

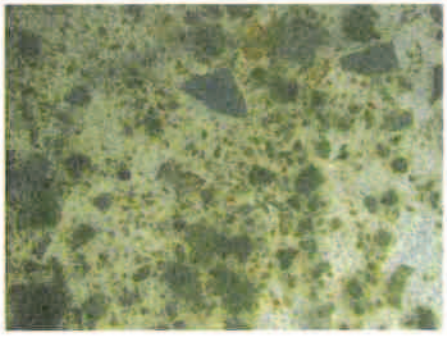

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

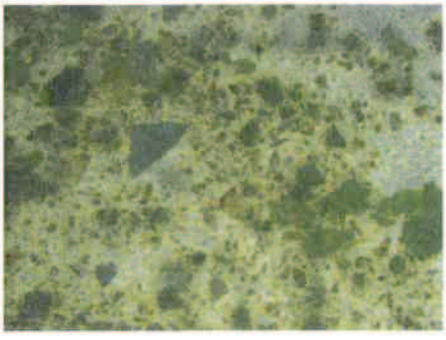

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2764）

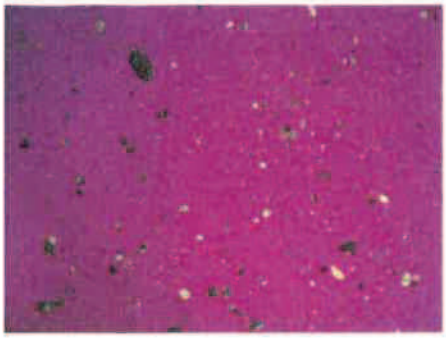

ID.No：8090
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

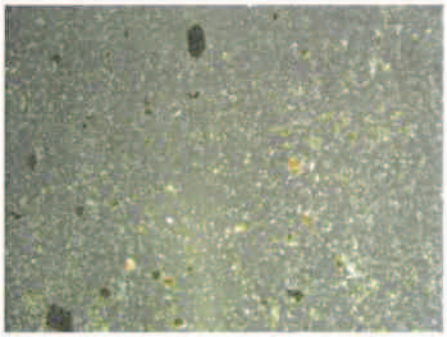

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

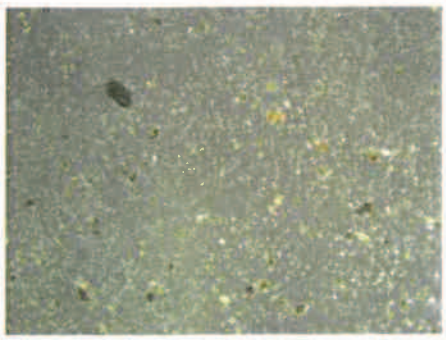

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

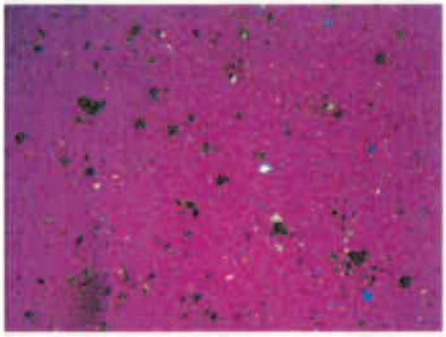

ID.No：8091
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

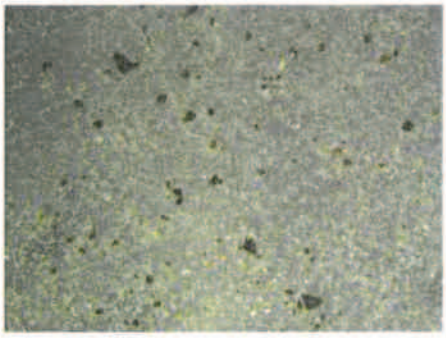

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

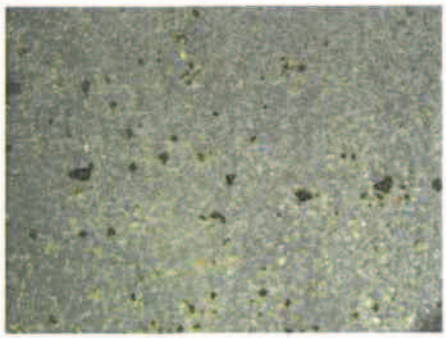

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

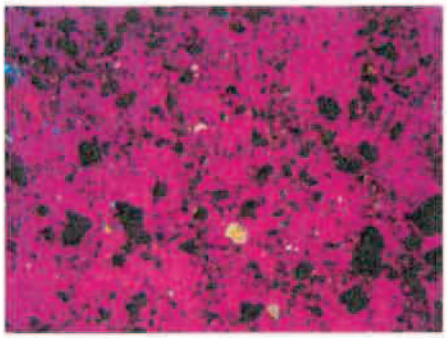

ID.No：8092
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

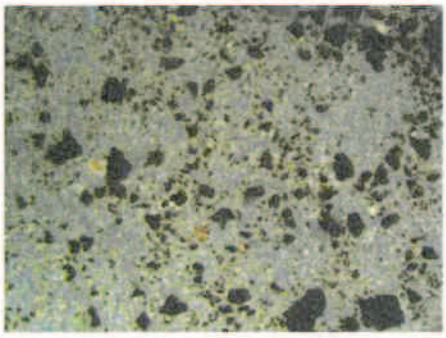

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

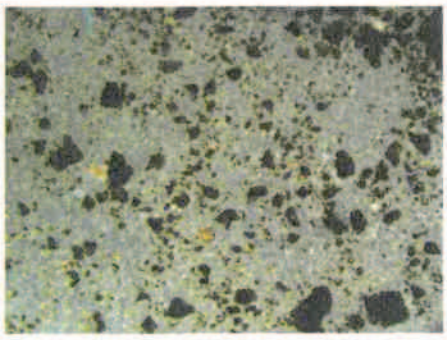

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

第22-B2765号

分 析 結 果 報 告 書

2022年9月28日

中城村長　浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号47-3
NVLAP LAB CODE：200652-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番21号
TEL：098－897－0910（代）

工　事　名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校　17-2号棟　中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月15日　～　2022年8月16日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター　仲座照幸・大濱常治・山内大輝・石原昌勝
分 析 対 象	建材試料：19検体　受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分　析　者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業（評価区分1）」
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月17日　分析終了日：2022年9月28日

分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。

[特記事項]
・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2765号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8093	3階　廊下　天井　穴あき石膏ボード	無検出	-	-	
8094	3階　廊下　天井　石膏ボード	無検出	-	-	
8095	3階　廊下　壁　モルタル金ゴテ	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8096	3階　廊下　巾木　ソフト巾木＆接着剤	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
8097	3階　廊下　床　長尺シート＆接着剤	無検出	-	-	
8098	3階　廊下(水飲み場)　床　長尺シート＆接着剤	無検出	-	-	
8099	3階　普通教室　天井　平石膏ボード下地ロックウール化粧吸音板	無検出	-	-	
8100	3階　普通教室　床　ビニール系床タイル＆接着剤	無検出	-	-	
8101	3階　普通教室　床　長尺シート＆接着剤	無検出	-	-	
8102	3階　便所　天井　フレキシブルボード	無検出	-	-	

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2022.9.26

株式会社沖縄環境分析センター

第22-B2765号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8103	3階　便所　壁　セラミックタイル	無検出	-	-	
8104	3階　便所　床　モザイクタイル	無検出	-	-	
8105	3階　外部　軒天　コンクリート打放し VPヌリ	無検出	-	-	
8106	3階　外部　外壁　モルタル刷毛引 VPヌリ	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	モルタルに含有
8107	3階　外部　建具廻り　シーリング材	無検出	-	-	
8108	R階　外部　屋根　シート防水①	無検出	-	-	
8109	R階　外部　屋根　シート防水②	無検出	-	-	
8110	R階　外部　屋根　シート防水③	無検出	-	-	
8111	R階　外部　屋根　塗膜防水	無検出	-	-	

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2022.9.26

株式会社沖縄環境分析センター

顕微鏡写真（22-B2765）

ID.No：8093
結果：石綿含有せず
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI

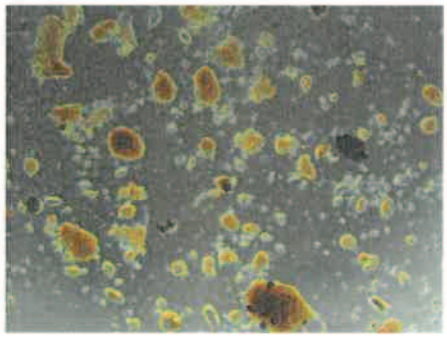

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥

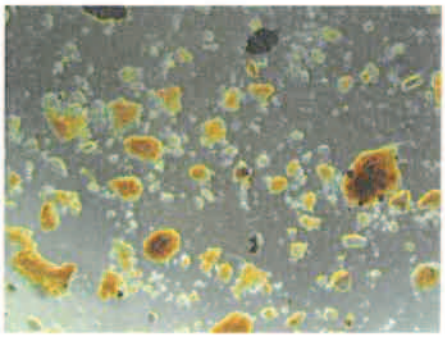

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

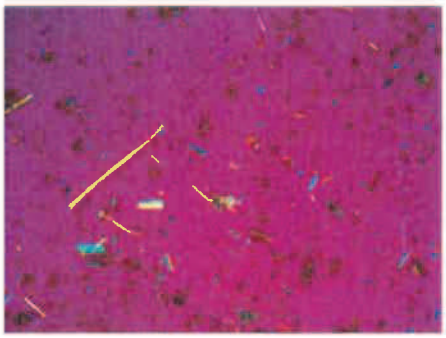

ID.No：8094
結果：石綿含有せず
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI

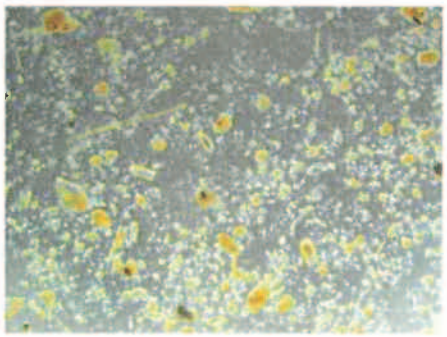

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥

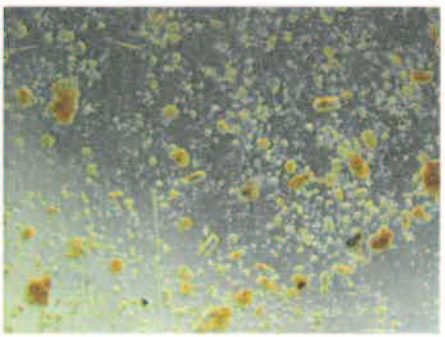

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

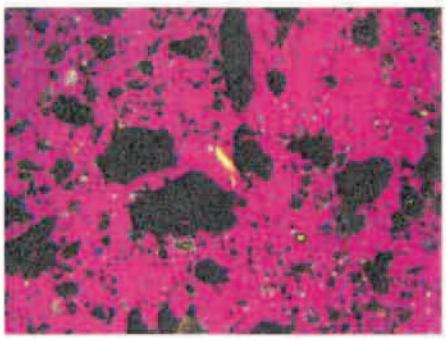

ID.No：8095
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI

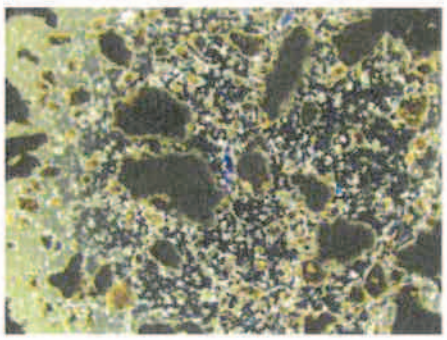

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥

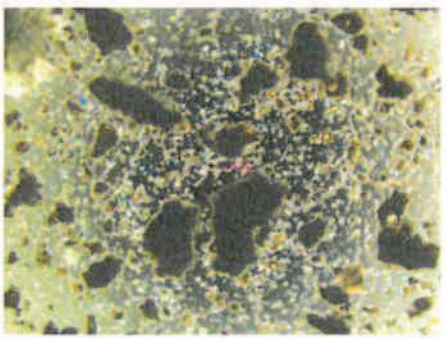

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

ID.No：8096
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI

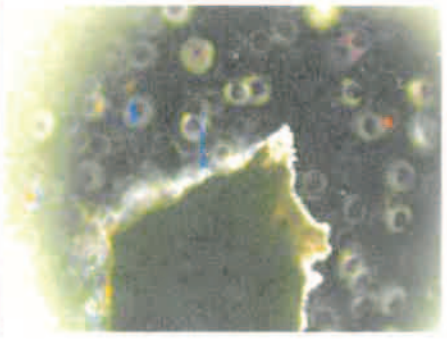

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥

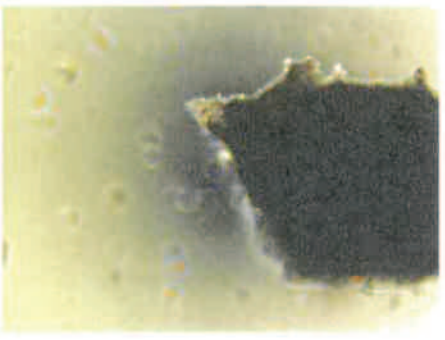

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

顕微鏡写真（22-B2765）

ID.No：8097
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

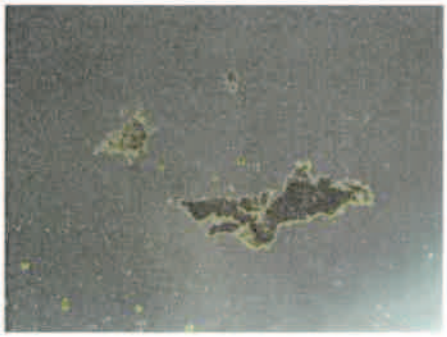

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

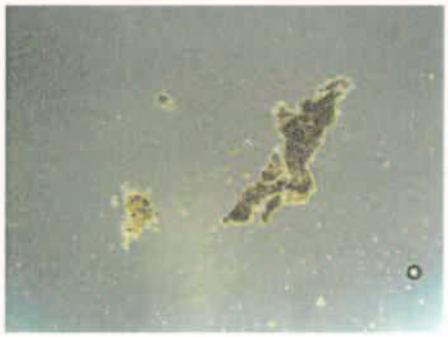

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

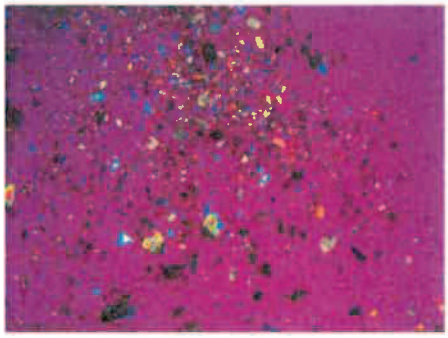

ID.No：8098
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

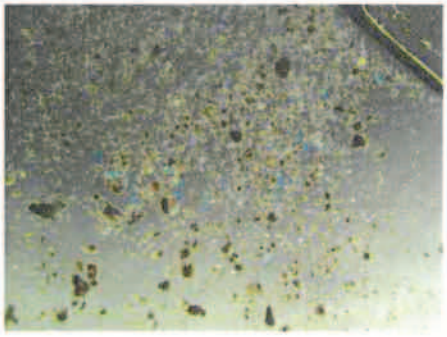

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

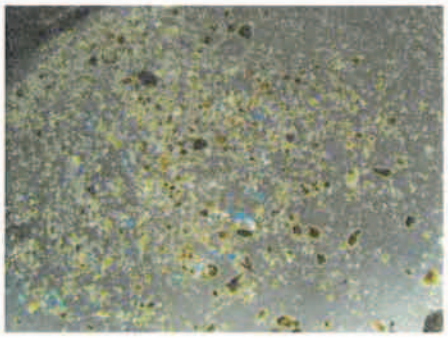

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

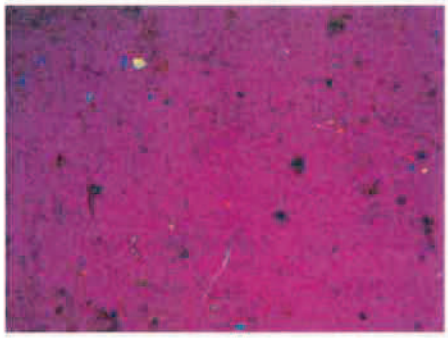

ID.No：8099
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

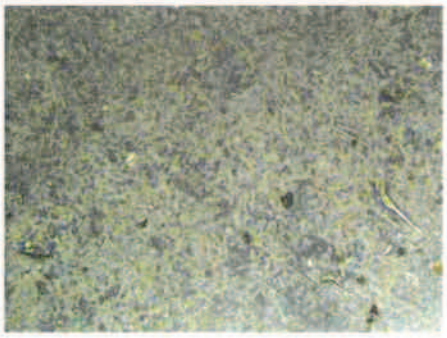

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

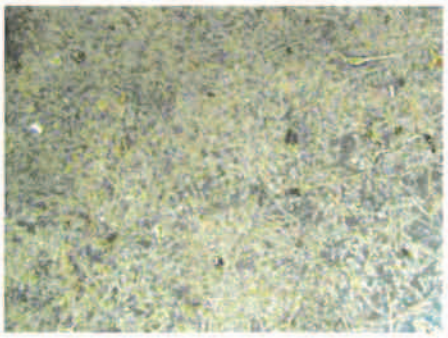

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

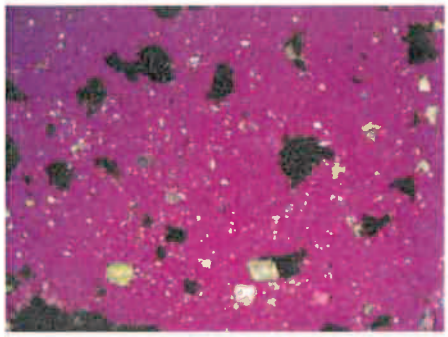

ID.No：8100
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

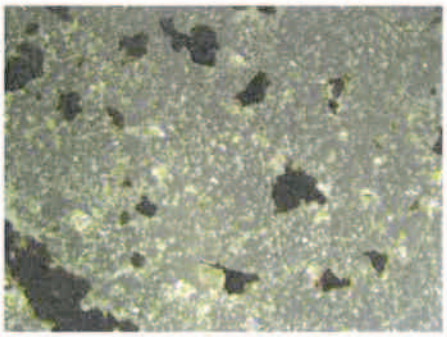

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

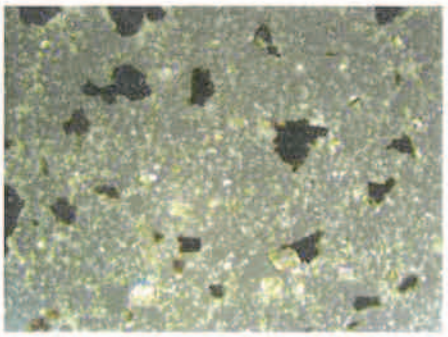

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2765）

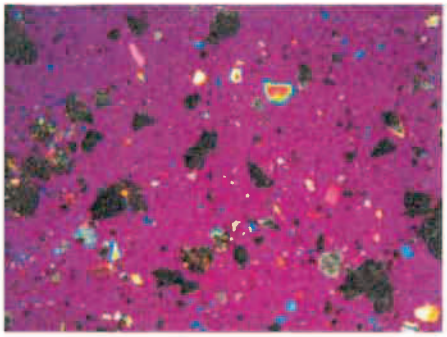

ID.No：8101
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

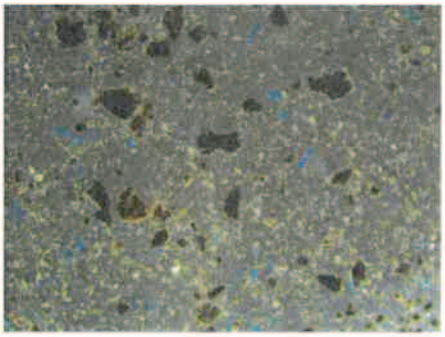

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

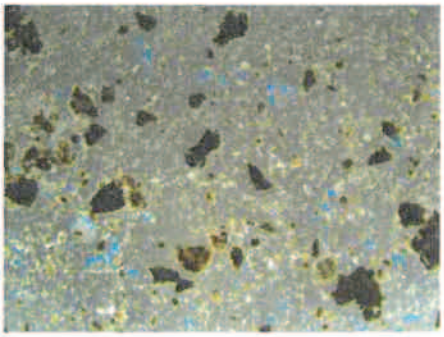

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

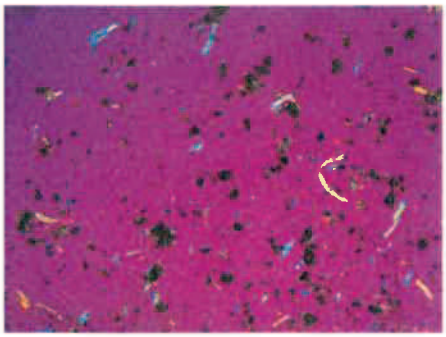

ID.No：8102
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

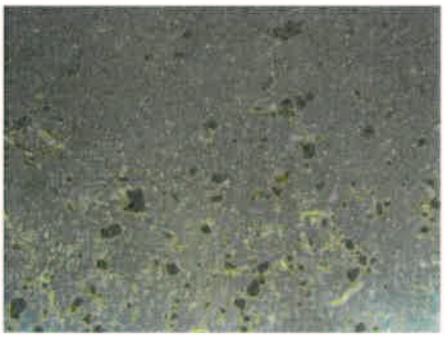

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

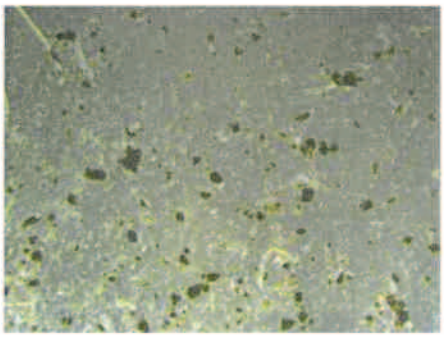

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

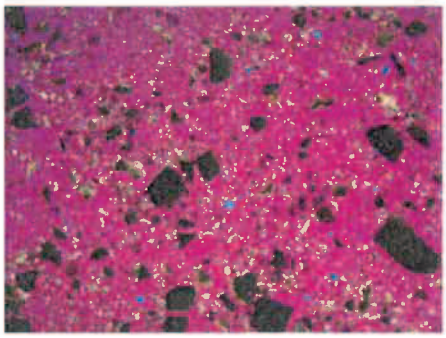

ID.No：8103
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

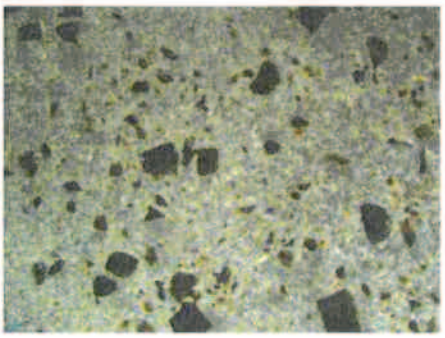

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

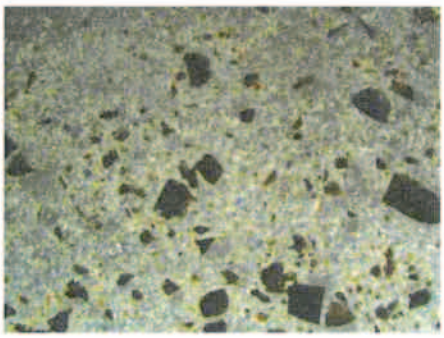

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

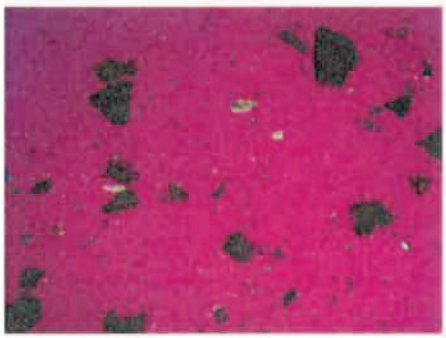

ID.No：8104
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

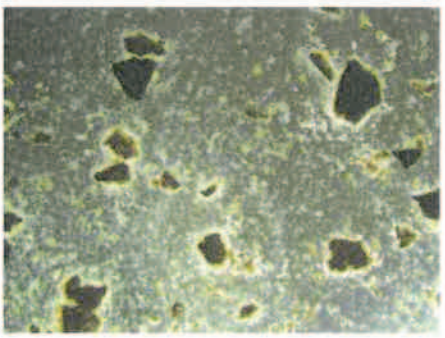

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

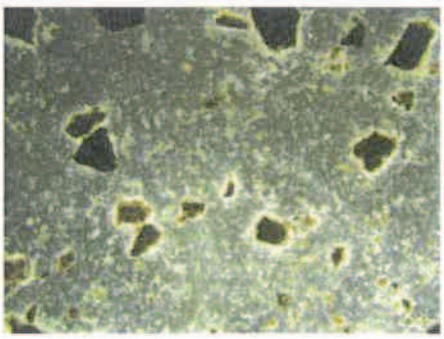

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2765）

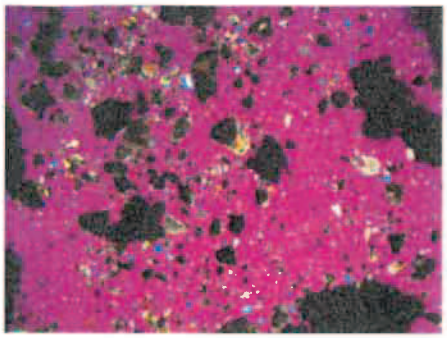

ID.No：8105
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

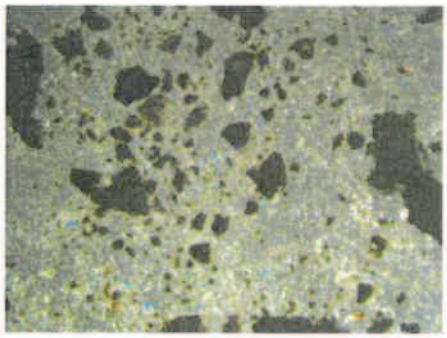

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

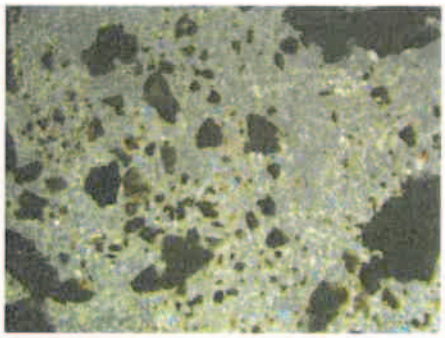

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

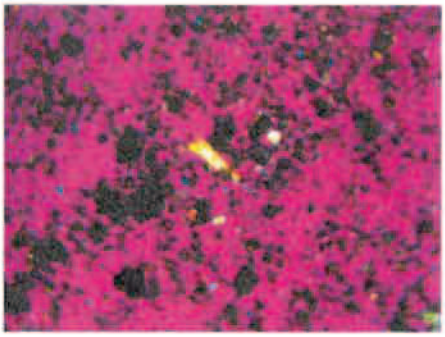

ID.No：8106
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

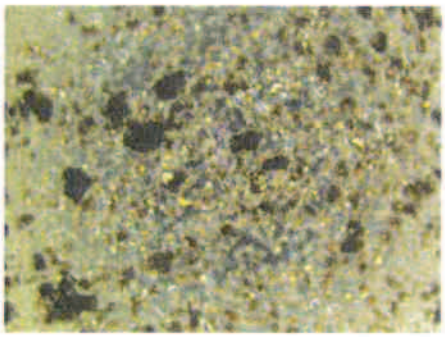

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

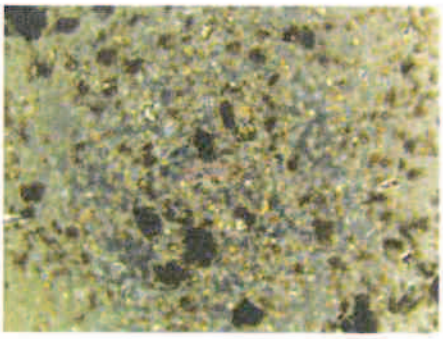

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

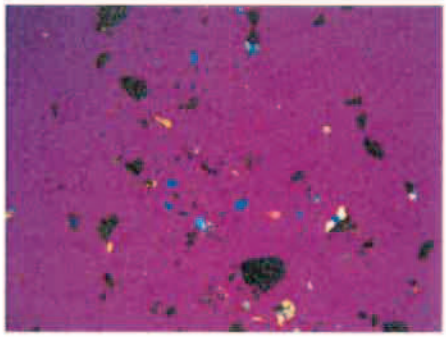

ID.No：8107
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

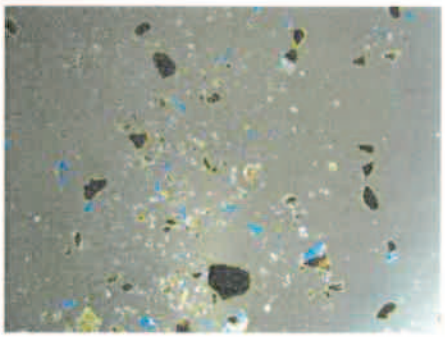

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

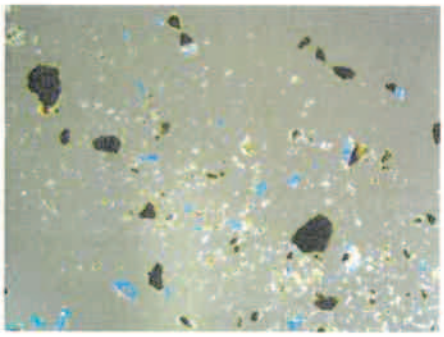

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

ID.No：8108
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

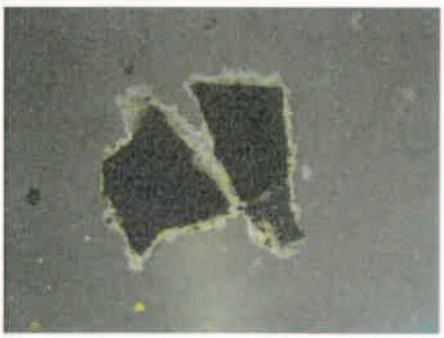

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

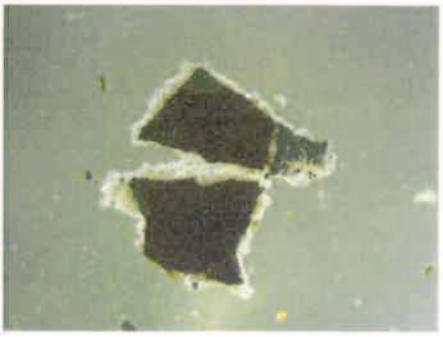

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2765）

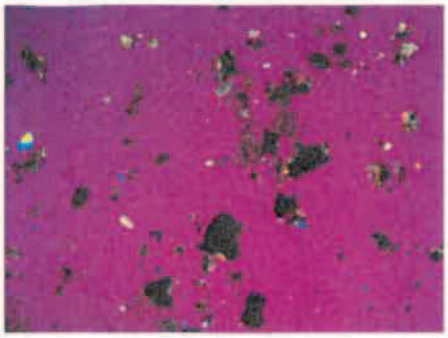

ID.No：8109
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

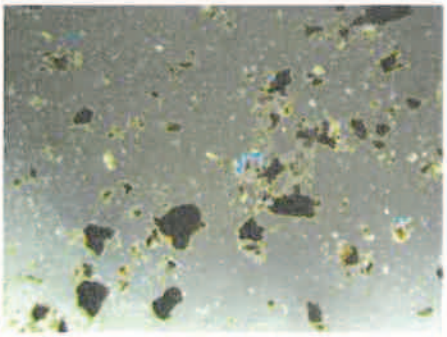

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

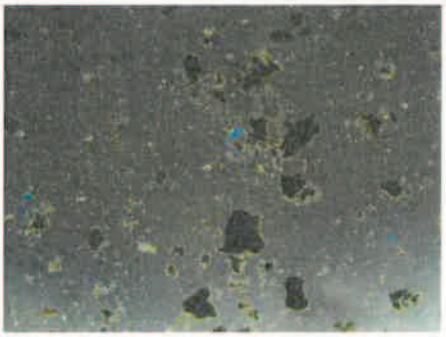

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

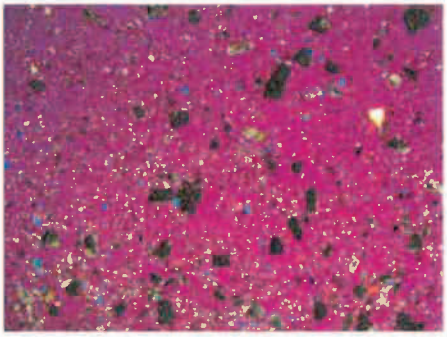

ID.No：8110
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

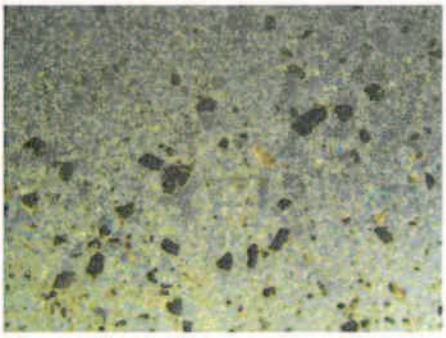

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

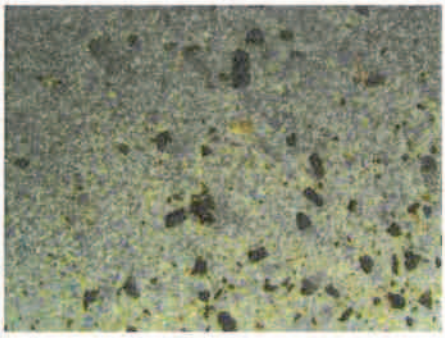

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

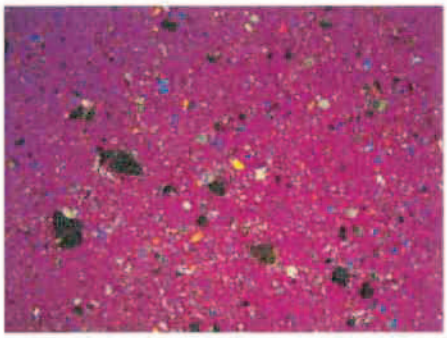

ID.No：8111
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

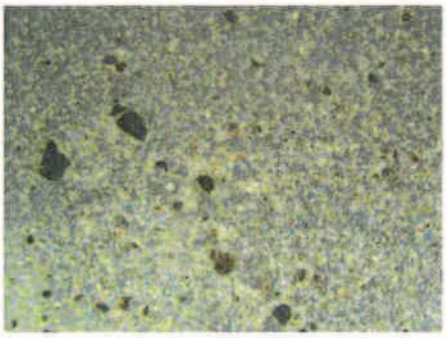

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

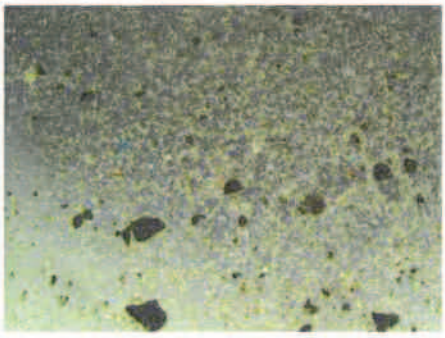

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

第22-B2766号

分 析 結 果 報 告 書

2022年9月28日

中城村長　浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号47-3
NVLAP LAB CODE：200885-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL：098－897－0910(代)

工　事　名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校　17-3号棟　中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月16日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター　山内大輝・石原昌勝
分 析 対 象	建材試料：2検体　　受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分　析　者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日：　2022年8月17日　　分析終了日：　2022年9月28日

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8112	1階　外部　外壁　モルタル刷毛引　VPヌリ	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	モルタルに含有
8113	1階　外部　外壁　目地材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

顕微鏡写真（22-B2766）

ID.No：8112
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI

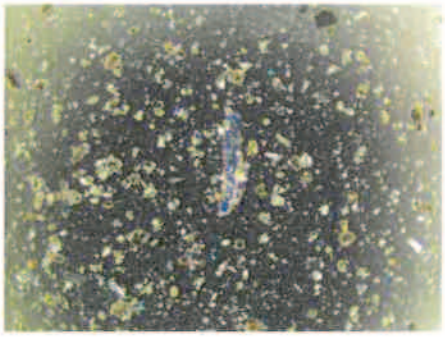

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥

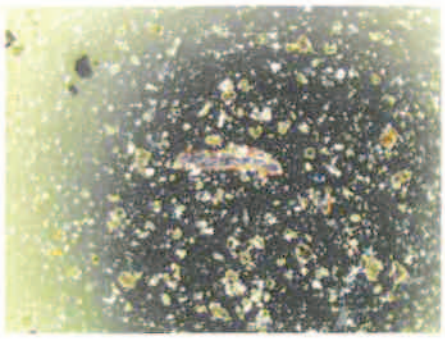

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

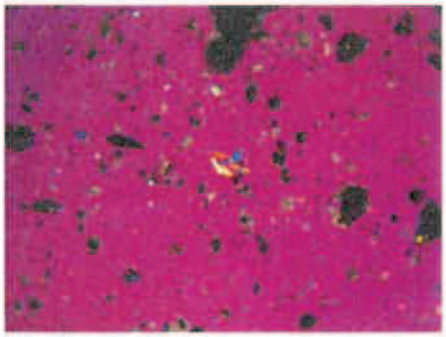

ID.No：8113
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI

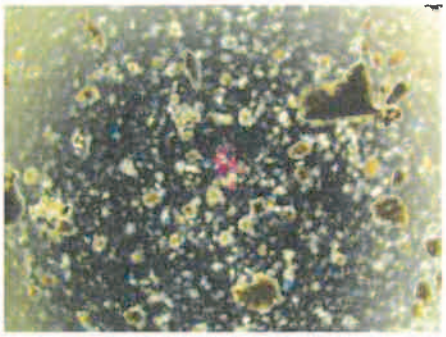

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥

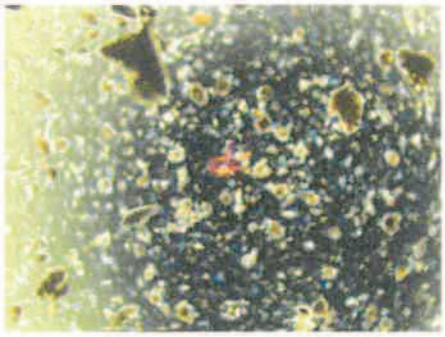

条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

第22-B2767号

分 析 結 果 報 告 書

2022年9月29日

中城村長　浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE：200655-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原[illegible]
TEL：098－897－[illegible]

工　事　名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校　18号棟　中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年7月10日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター　仲座照幸・山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志
分 析 対 象	建材試料：12検体　　受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分　析　者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業（評価区分1）」
分 析 期 間	試料受付日：　2022年8月17日　　分析終了日：　2022年9月28日

分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。

[特記事項]
・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2767号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8114	1階　給食配膳室　壁　複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
8115	1階　給食配膳室　巾木　モルタル巾木	無検出	-	-	
8116	1階　給食配膳室　床　磁器質モザイクタイル	無検出	-	-	
8117	1階　給湯室　壁　セラミックタイル	無検出	-	-	
8118	1階　給湯室　床　長尺シート&接着剤	無検出	-	-	
8119	1階　廊下　巾木　ソフト巾木&接着剤	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
8120	2階　教科備品室　天井　穴あき石膏ボード	無検出	-	-	
8121	2階　教科備品室　床　ビニール系床タイル&接着剤	無検出	-	-	
8122	1階　外部　軒天　複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
8123	1階　外部　外壁　複層塗材及び下地材	無検出	-	-	

[特記事項]
・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2022.9.26

株式会社沖縄環境分析センター之印

第22-B2767号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8124	1階　外部　建具廻り　シーリング材	無検出	-	-	
8125	R階　外部　屋根　シート防水	無検出	-	-	

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

株式会社沖縄環境分析センター 之印

顕微鏡写真（22-B2767）

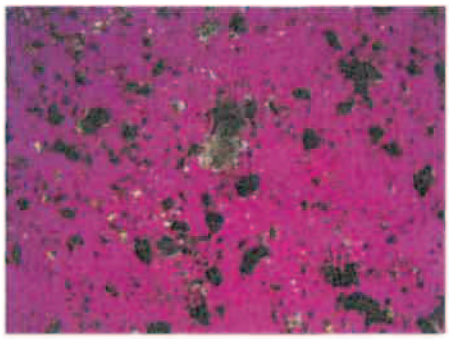
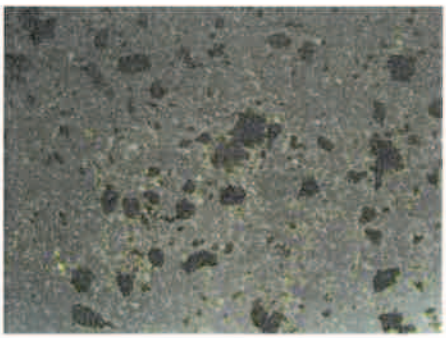
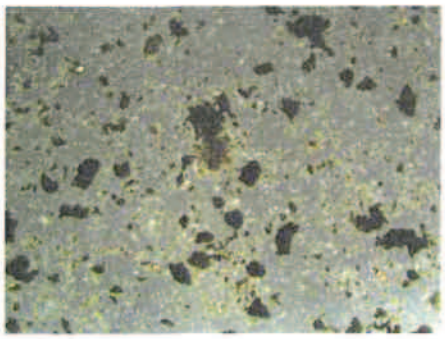

ID.No：8114
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

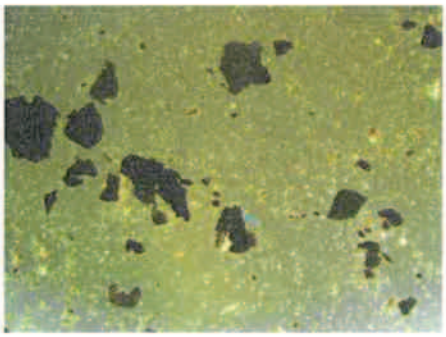
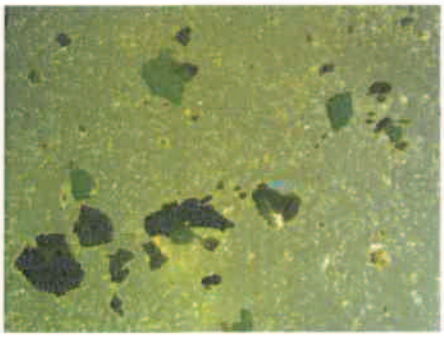

ID.No：8115
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

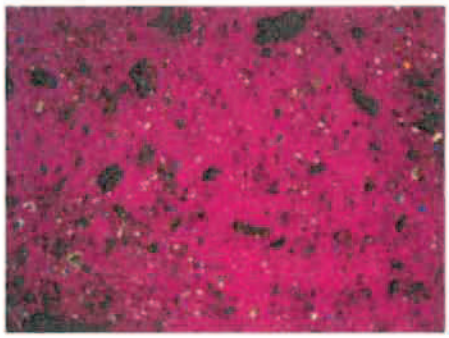
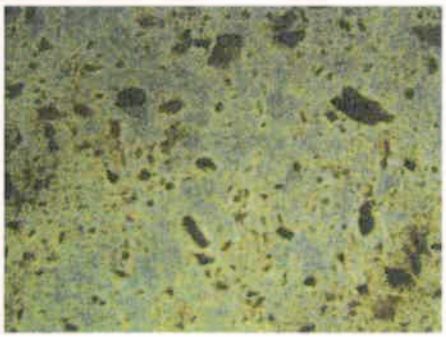
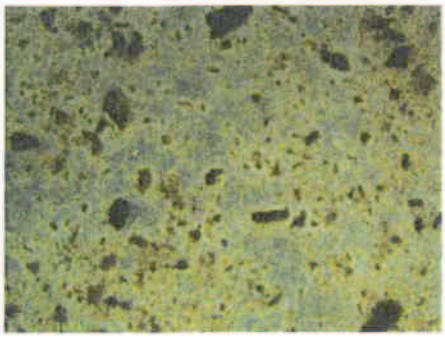

ID.No：8116
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

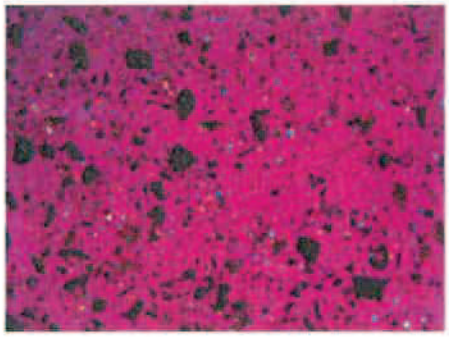
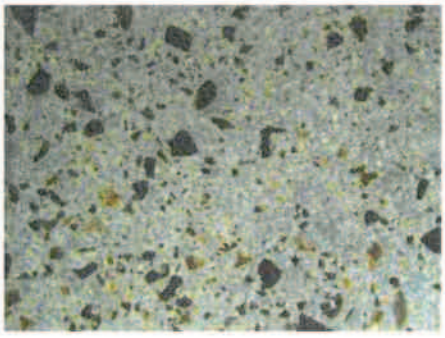
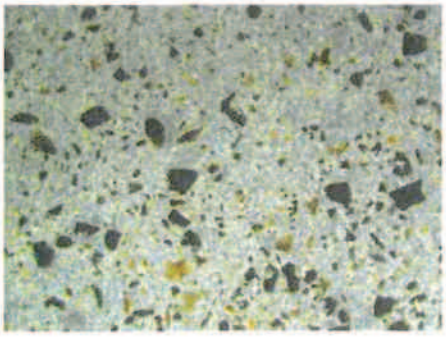

ID.No：8117
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2767）

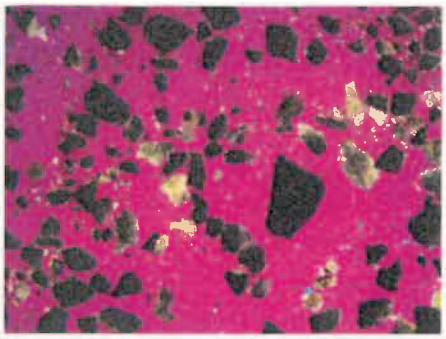

ID.No：8118
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

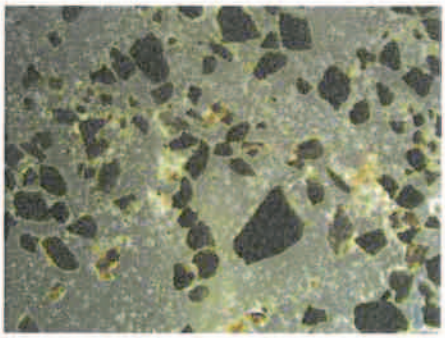

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

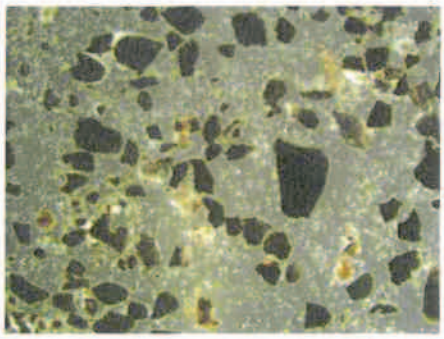

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

ID.No：8119
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

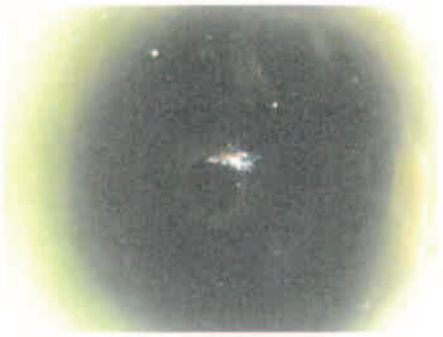

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

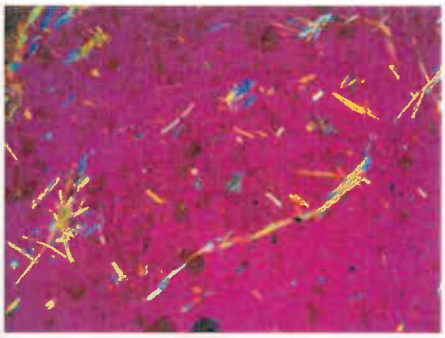

ID.No：8120
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

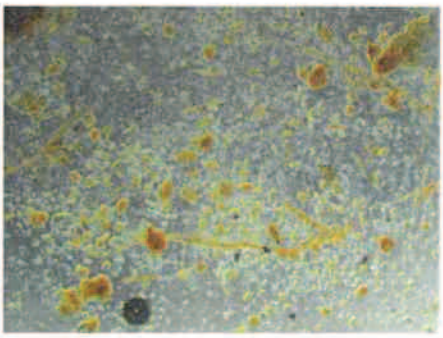

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

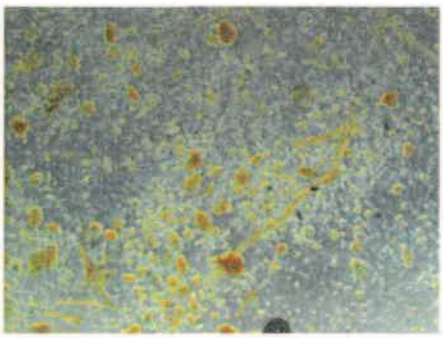

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

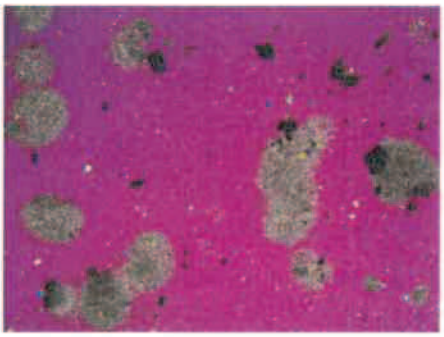

ID.No：8121
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

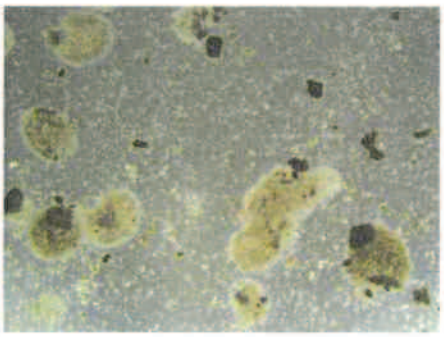

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

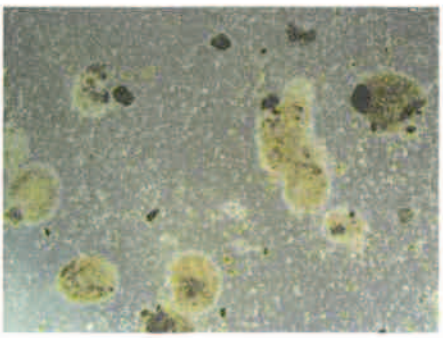

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2767）

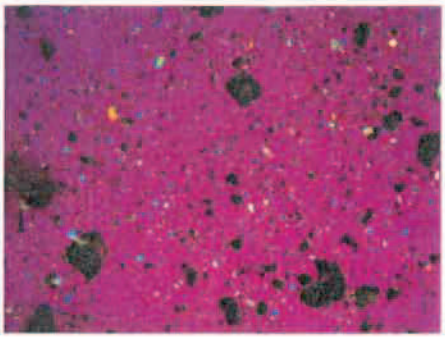
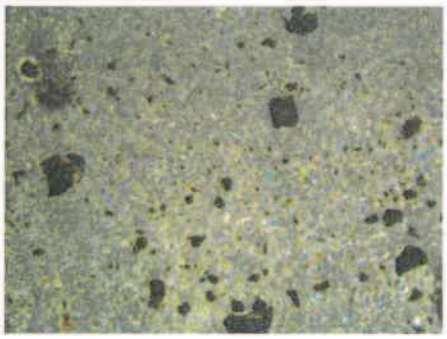
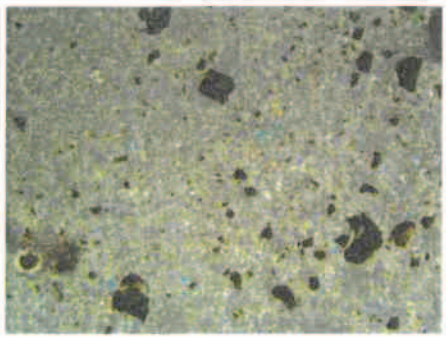

ID.No：8122
結果：石綿含有せず
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI　条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥　条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

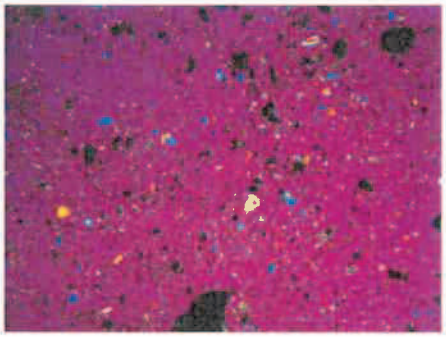
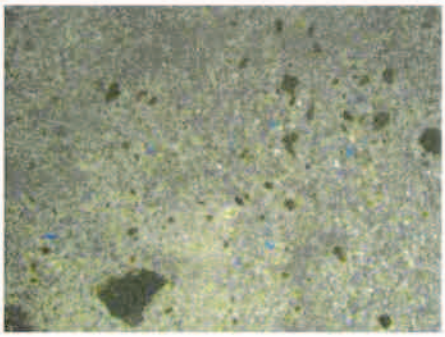
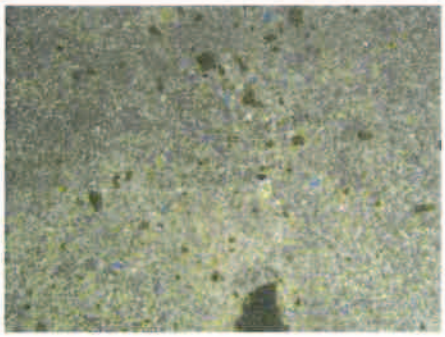

ID.No：8123
結果：石綿含有せず
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI　条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥　条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

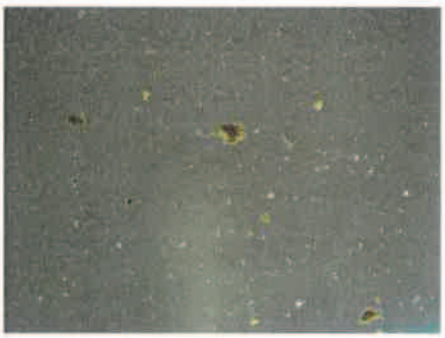
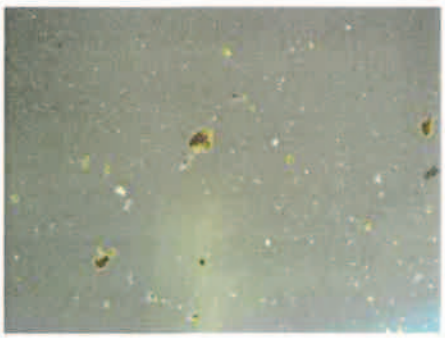

ID.No：8124
結果：石綿含有せず
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI　条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥　条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

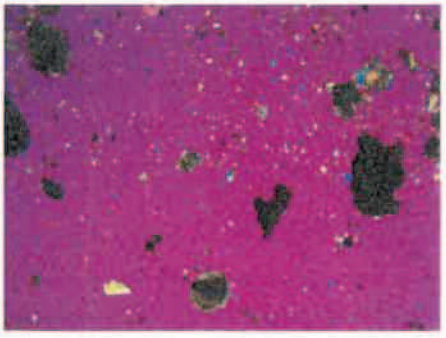
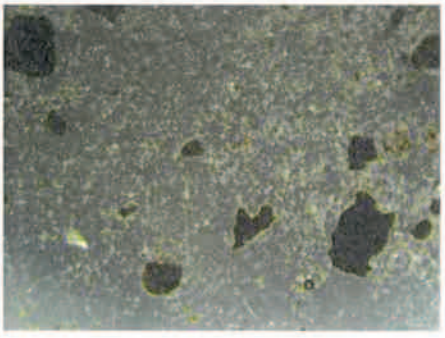
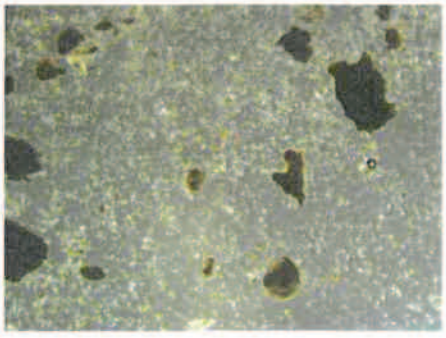

ID.No：8125
結果：石綿含有せず
条件：10×10,1.550HD,Crs-n,RI　条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,⊥　条件：10×10,1.550HD,Op-n,CS,//

第22-B2768号

分 析 結 果 報 告 書

2022年9月29日

中城村長　浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE 200552-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原1丁目7番14号
TEL：098－897－0910

工　事　名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校　19号棟　中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年7月10日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター　仲座照幸・山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志
分 析 対 象	建材試料：12検体　　受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分　析　者	株式会社 沖縄環境分析センター 名嘉眞健志「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日：　2022年8月17日　　分析終了日：　2022年9月28日

分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。

[特記事項]
・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2768号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8126	B1階　機械室　壁(配管道奥側)　繊維強化プラスチック	無検出	-	-	
8127	1階　昇降口　床　コンクリート打金ゴテ	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8128	1階　消毒槽　床　防滑シート&接着剤及び下地材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8129	1階　倉庫　壁(Pコン穴)　モルタル金ゴテ	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8130	1階　倉庫　巾木　モルタル巾木	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8131	1階　男子便所　天井　コンクリート打放し、グラインダー掛け	無検出	-	-	
8132	1階　男子便所　腰壁　セラミックタイル	無検出	-	-	
8133	1階　女子便所　壁　吹付タイル及び下地材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8134	1階　女子便所　床　モザイクタイル	無検出	-	-	
8135	1階　外部　軒天　複層塗材及び下地材	無検出	-	-	

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2022.9.26

株式会社沖縄環境分析センター印

第22-B2768号

分析結果一覧

中城村長　浜田京介　殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8136	1階　外部　外壁　モルタル塗り金ゴテ下地AP塗り	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	モルタルに含有
8137	1階　外部　建具廻り　シーリング材	無検出	-	-	

[特記事項]　・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2021.9.26

株式会社沖縄分析センター印

顕微鏡写真（22-B2768）

ID.No：8126
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

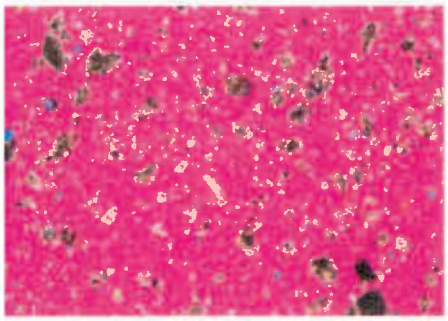

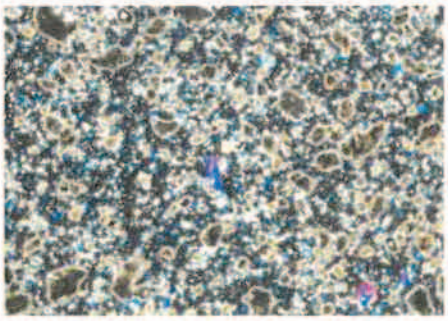

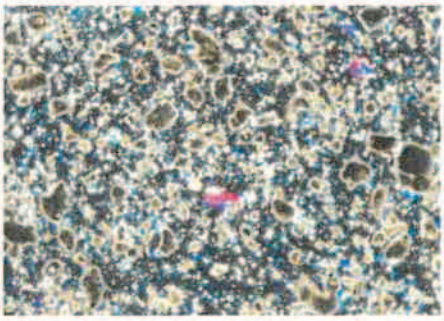

ID.No：8127
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

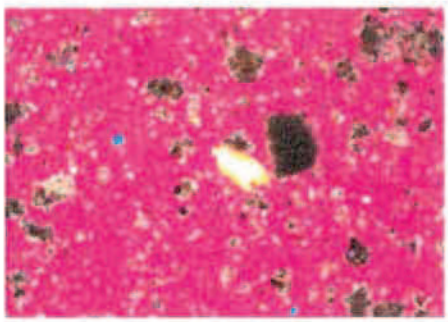

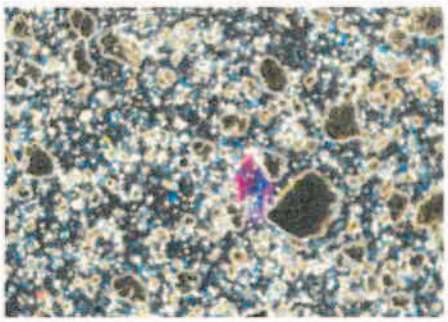

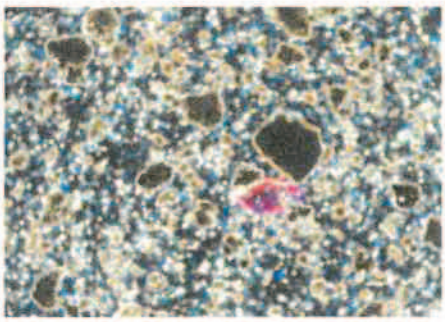

ID.No：8128
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

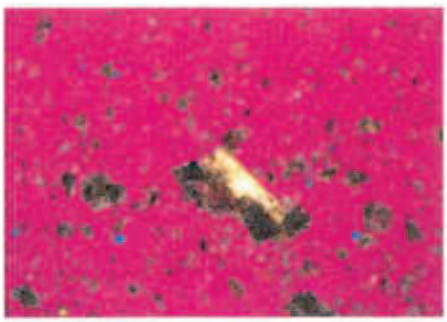

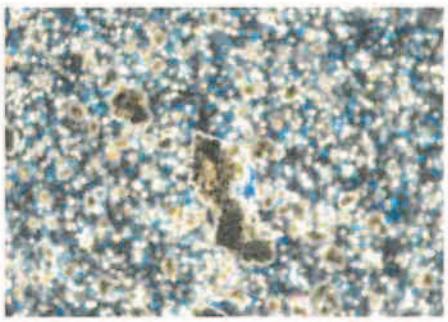

ID.No：8129
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2768）

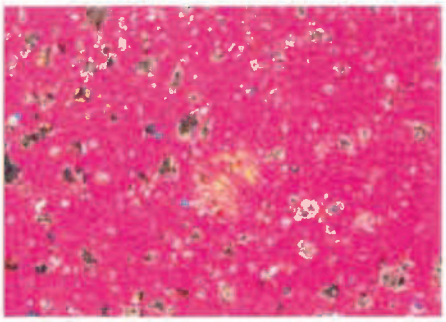

ID.No：8130
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

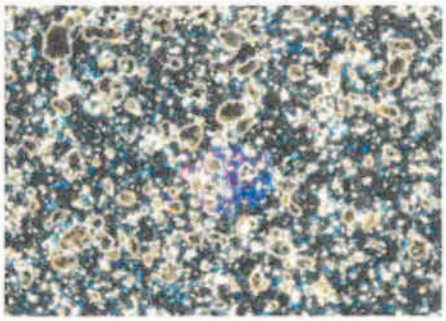

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

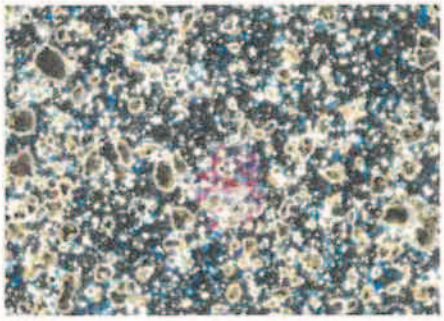

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

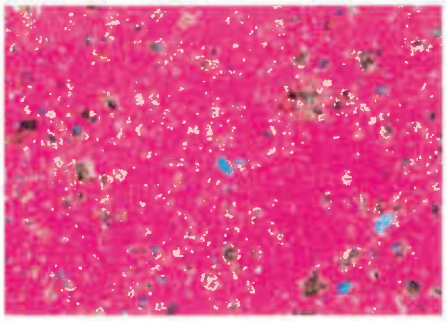

ID.No：8131
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

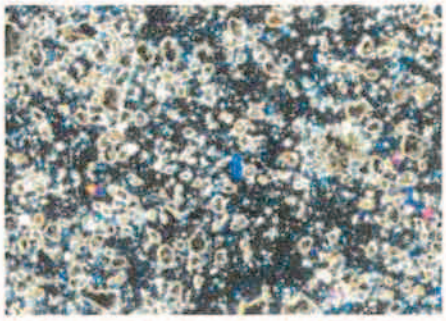

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

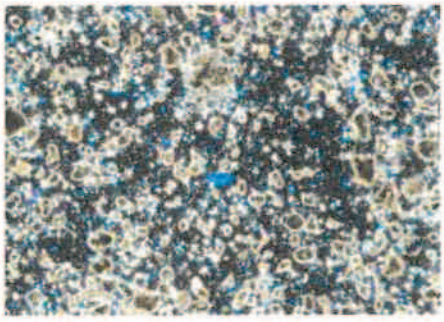

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

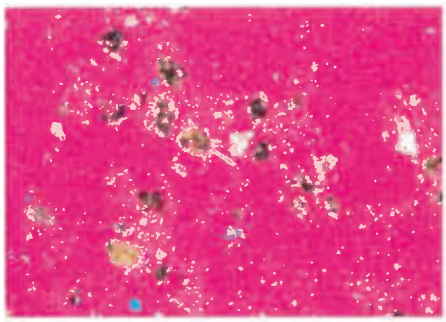

ID.No：8132
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

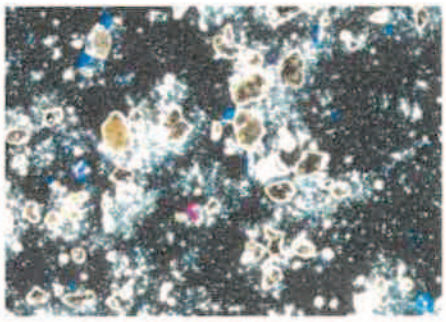

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

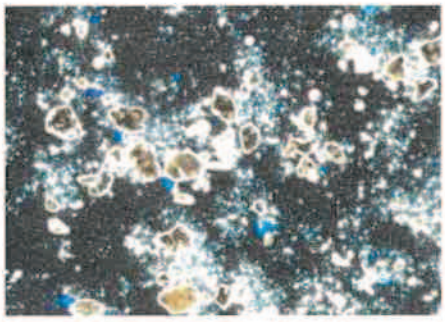

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

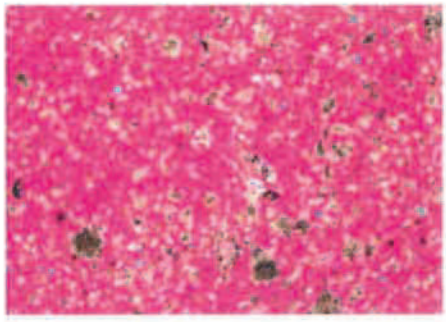

ID.No：8133
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

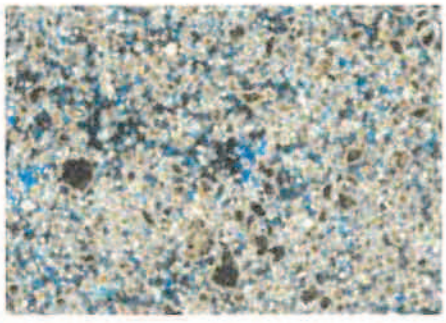

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

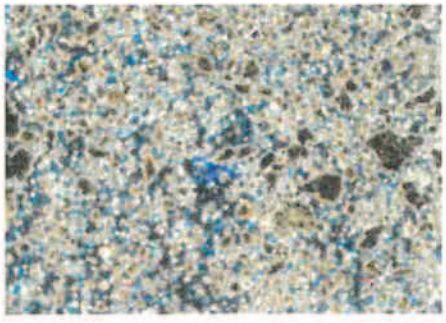

条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真（22-B2768）

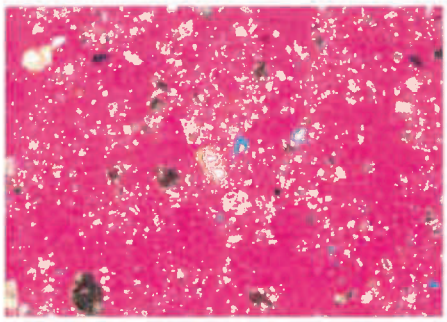
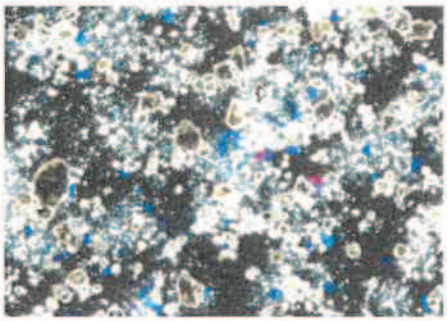
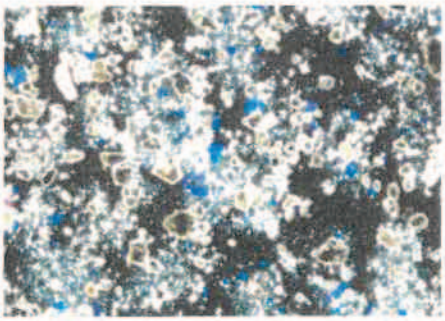

ID.No：8134
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

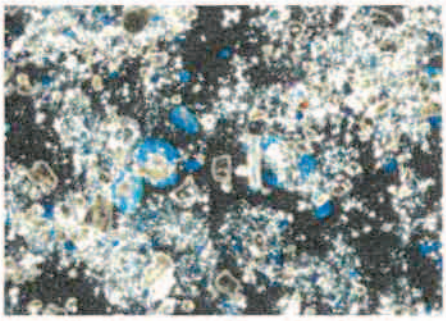
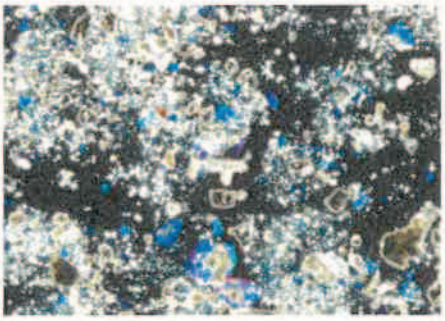

ID.No：8135
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

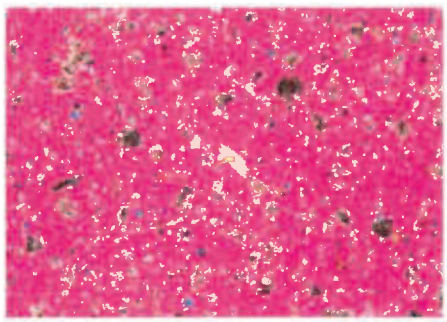
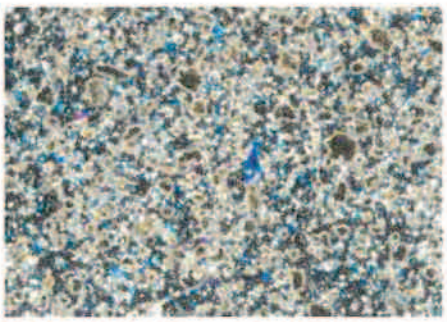
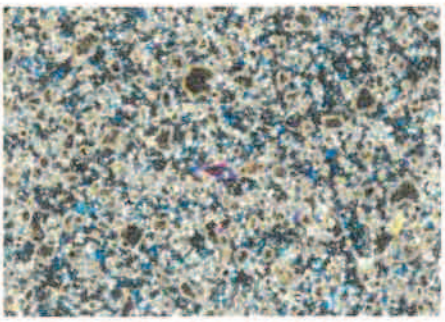

ID.No：8136
結果：石綿含有（クリソタイル）
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

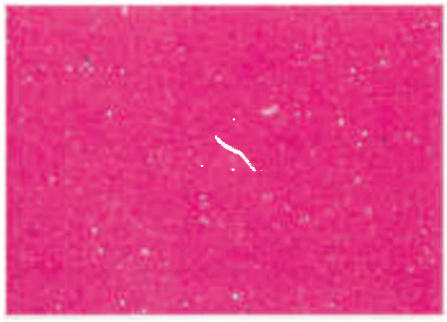
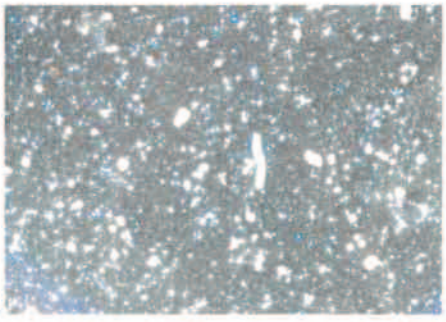
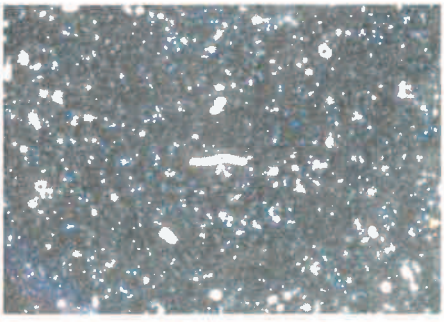

ID.No：8137
結果：石綿含有せず
条件：10×10, 1.550HD, Crs-n, RI　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥　条件：10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //
